Bauetappenplan Teilabbruch Mattenhof (06.01.14 - 30.05.14)
Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof

2. Abbruch und Provisorien (06.01.-14.02.14 = 6 Wochen)

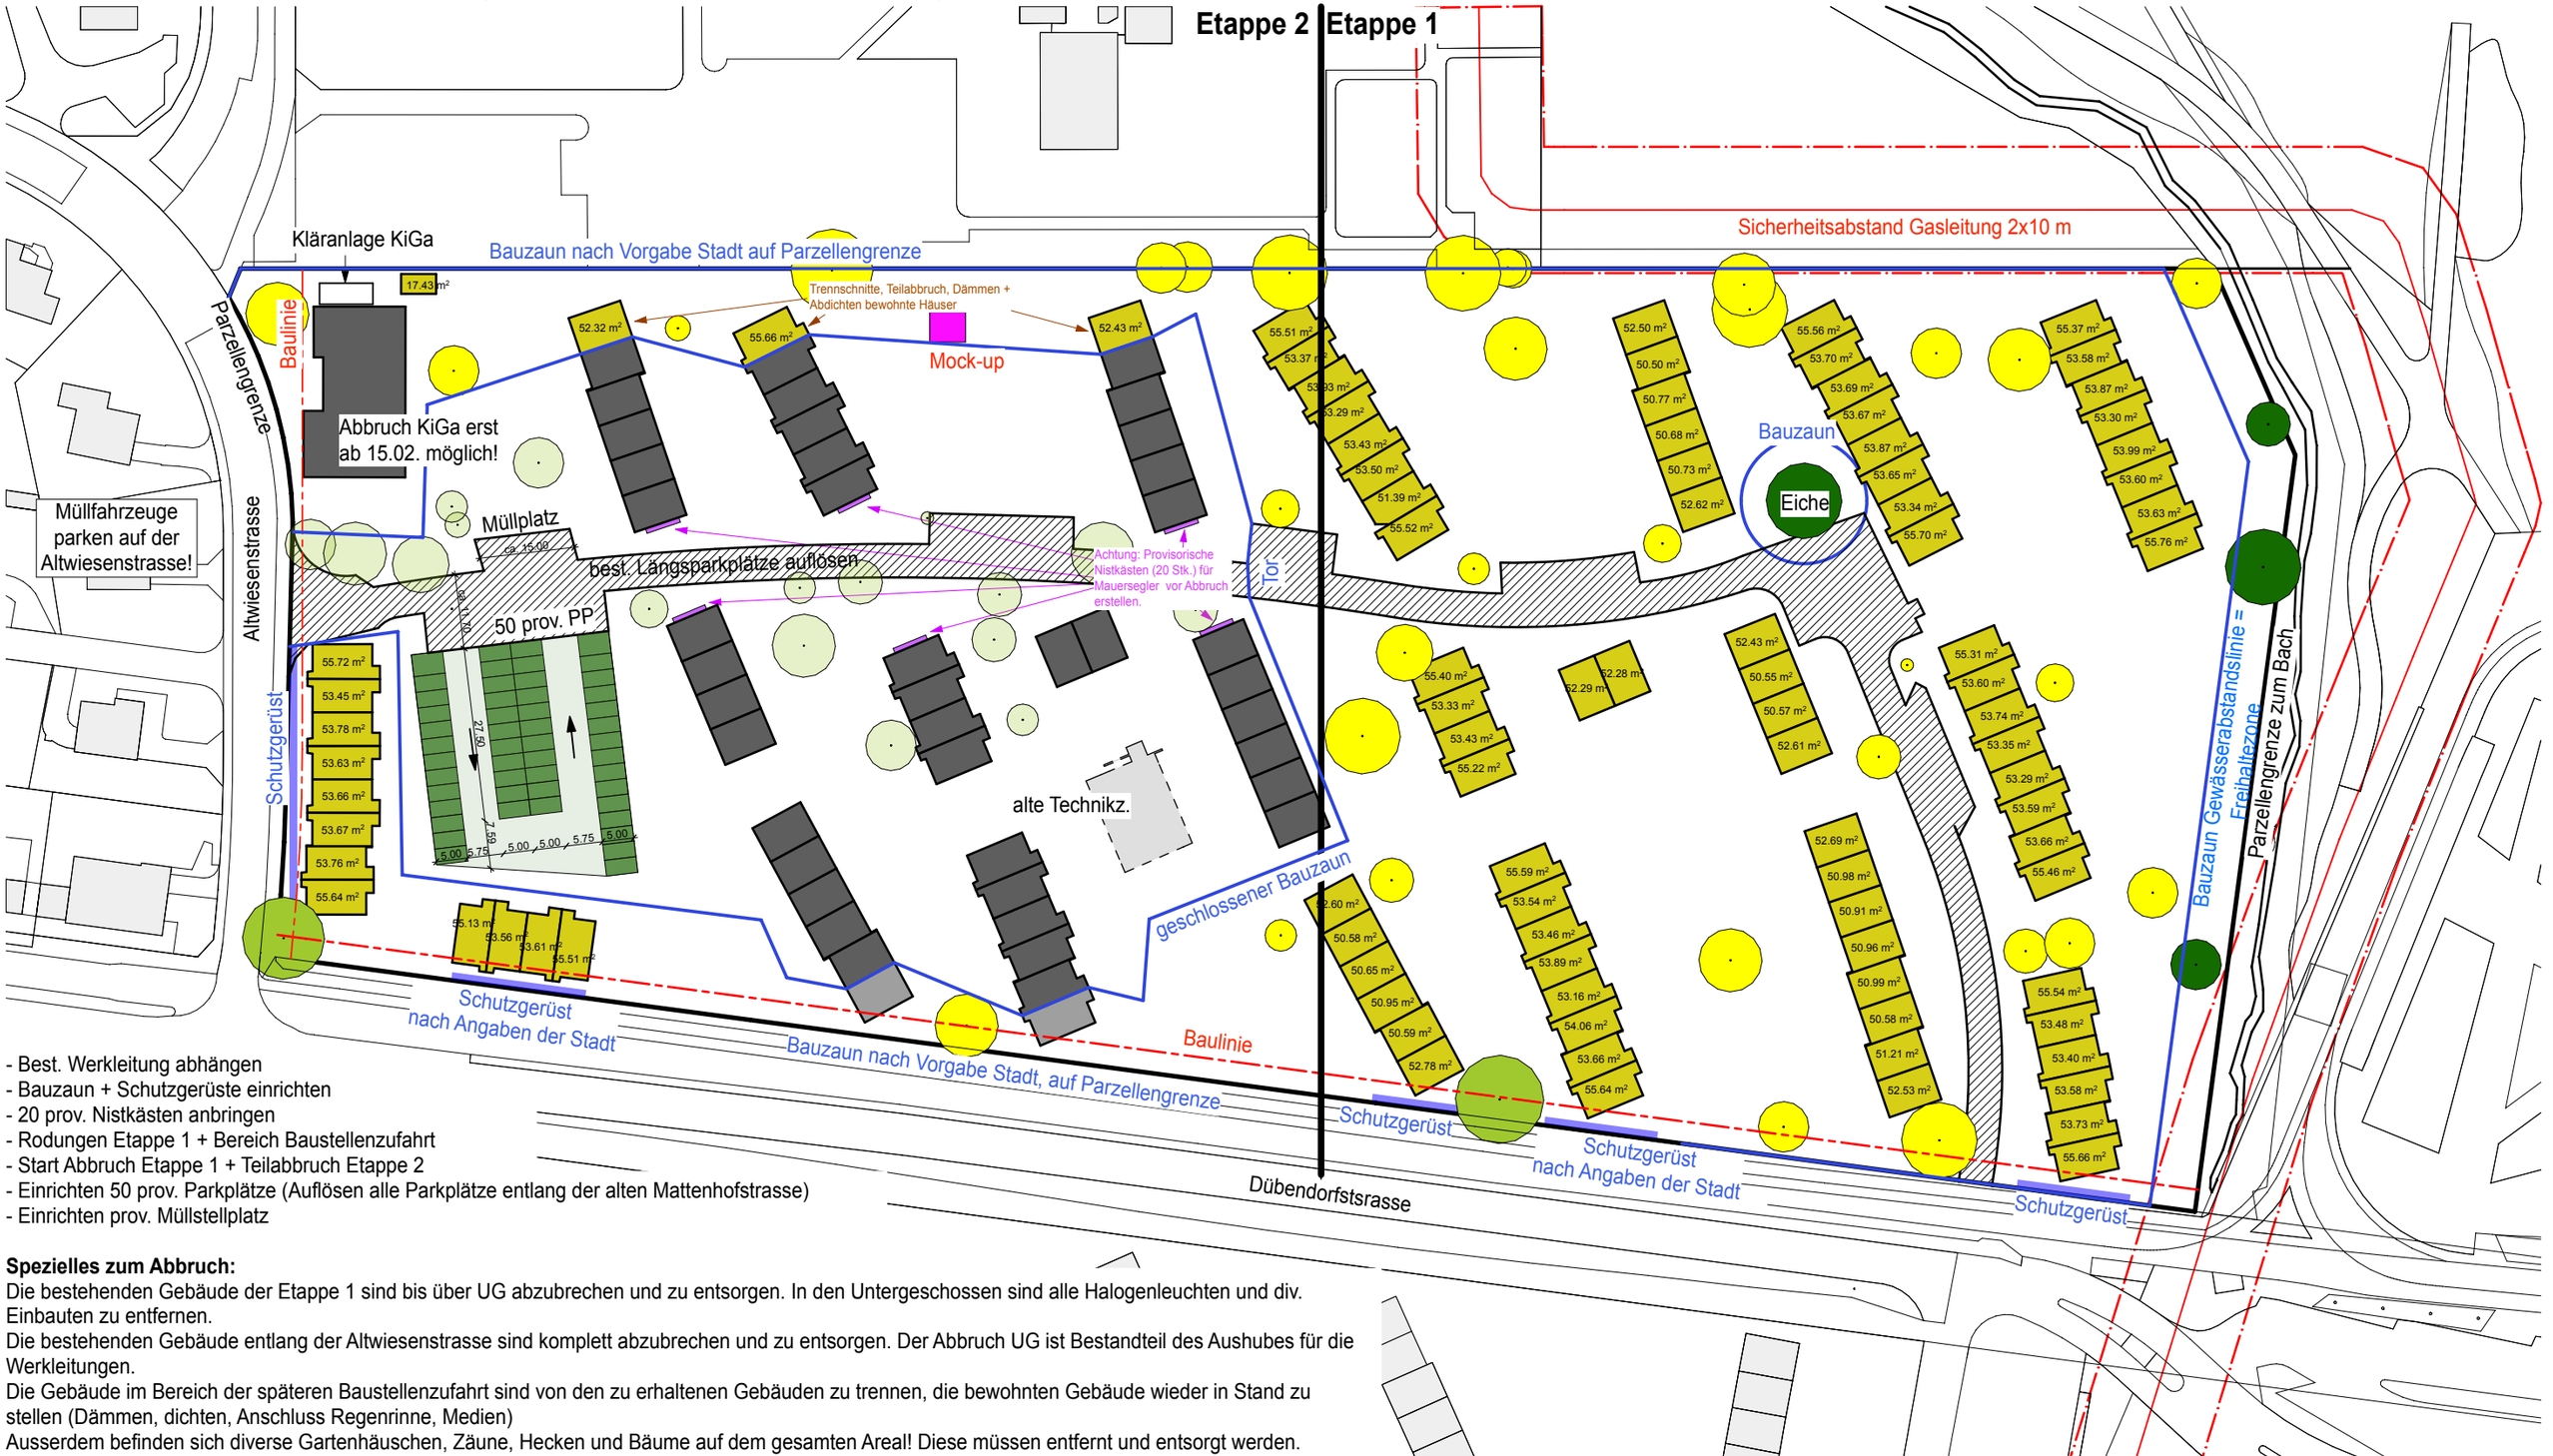

- Best. Werkleitung abhängen
- Bauzaun + Schutzgerüste einrichten
- 20 prov. Nistkästen anbringen
- Rodungen Etappe 1 + Bereich Baustellenzufahrt
- Start Abbruch Etappe 1 + Teilabbruch Etappe 2
- Einrichten 50 prov. Parkplätze (Auflösen alle Parkplätze entlang der alten Mattenhofstrasse)
- Einrichten prov. Müllstellplatz

Spezielles zum Abbruch:
Die bestehenden Gebäude der Etappe 1 sind bis über UG abzubrechen und zu entsorgen. In den Untergeschossen sind alle Halogenleuchten und div. Einbauten zu entfernen.
Die bestehenden Gebäude entlang der Altwiesenstrasse sind komplett abzubrechen und zu entsorgen. Der Abbruch UG ist Bestandteil des Aushubes für die Werkleitungen.
Die Gebäude im Bereich der späteren Baustellenzufahrt sind von den zu erhaltenen Gebäuden zu trennen, die bewohnten Gebäude wieder in Stand zu stellen (Dämmen, dichten, Anschluss Regenrinne, Medien)
Ausserdem befinden sich diverse Gartenhäuschen, Zäune, Hecken und Bäume auf dem gesamten Areal! Diese müssen entfernt und entsorgt werden.
Der Umfang der Abbrucharbeiten ist mit der Besichtigung vor Ort zu bestimmen.
